

Planificación del proyecto

La planificación del proyecto constituye una de las actividades más relevantes dentro de la gestión del desarrollo de software. Planificar implica anticipar el trabajo necesario, organizar recursos, estimar tiempos y establecer mecanismos de control que permitan alcanzar los objetivos definidos. Un proyecto sin planificación adecuada incrementa considerablemente la probabilidad de retrasos, sobrecostos, conflictos internos y productos finales de baja calidad.


La calendarización y los hitos son elementos fundamentales en la gestión de proyectos de software, ya que proporcionan estructura, seguimiento y control. Los hitos

Cronograma del proyecto

El cronograma es la representación temporal de las tareas necesarias para ejecutar el proyecto, detalla las secuencias de actividades, duraciones, dependencias y hitos necesarios para completar un proyecto.

El equipo recibe orientación mediante las fechas de inicio y fin, duración estimada, dependencias entre actividades, puntos de control, asignación de recursos y entregables clave que llevan a la finalización del proyecto.

Su finalidad principal es brindar visibilidad sobre el avance y facilitar la toma de decisiones.

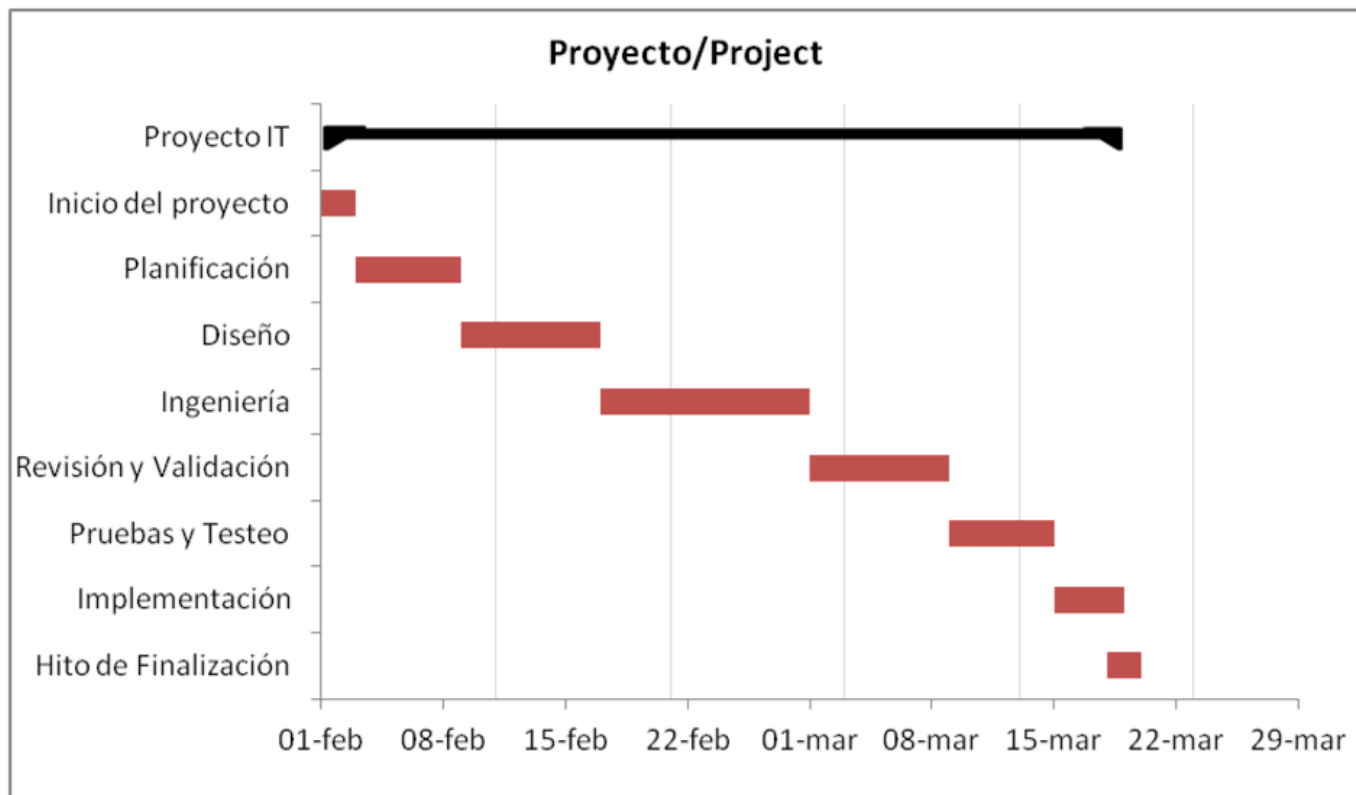

Hitos del proyecto

Un hito es un evento significativo que marca el cumplimiento de una etapa importante. A diferencia de una tarea, no posee duración ni consumo directo de recursos.

Representa un logro verificable dentro del proyecto, y ayuda a saber si el proyecto está progresando como se planificó.


Los hitos bien definidos deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con tiempo definido (SMART).

Los hitos cumplen varias funciones:

- Marcar avances relevantes.
- Facilitar el seguimiento ejecutivo.
- Detectar desvíos tempranos.
- Mejorar la comunicación con stakeholders.
- Validar entregables parciales.

Ejemplos de hitos en proyectos de software:

- Documento de requisitos aprobado.
- Diseño de arquitectura validado.
- Prototipo funcional entregado.
- Primer sprint completado.
- Versión beta publicada.
- Pruebas de aceptación aprobadas.
- Go-live ejecutado.
- Cierre formal del proyecto.

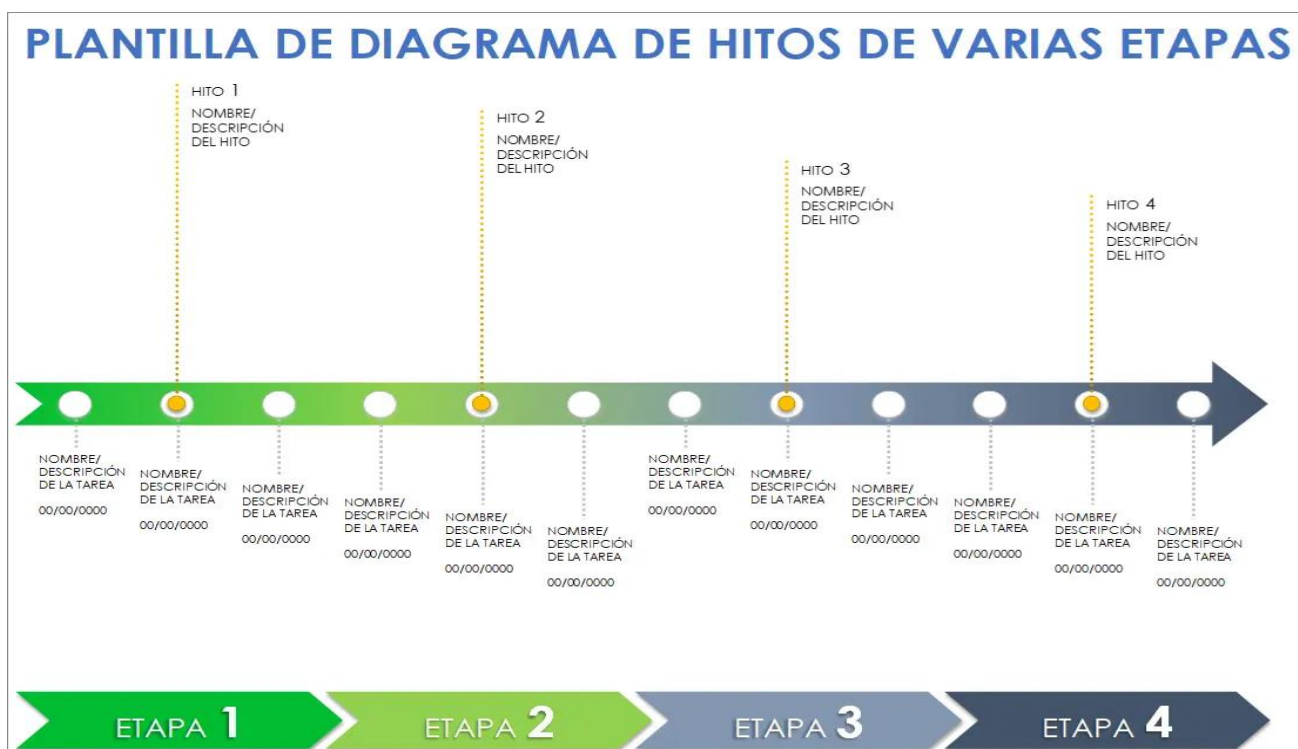

Entregables

Los entregables del proyecto son todos los resultados o productos que la empresa necesita para alcanzar un objetivo de proyecto o negocio. Su función fundamental radica en brindar claridad, facilitar el seguimiento del progreso y, en última instancia, garantizar la satisfacción de las partes interesadas.

Es decir, son el resultado que esperas tener al finalizar tu proyecto. Un proyecto puede tener uno o varios entregables, y saber cuáles son los entregables y comunicarlos con claridad al equipo y a los demás involucrados puede ser útil para cumplir con los objetivos del proyecto.

Los objetivos de los proyectos serán útiles para preparar los entregables de tus proyectos. Cuando defines los objetivos, también capturas los beneficios y los resultados que esperas obtener con dichos entregables; especialmente, en lo que respecta al esquema más amplio de las metas del proyecto y los objetivos de la empresa.

- Ejemplo de un objetivo de un proyecto: Aumentar la seguridad de la empresa con la incorporación del inicio de sesión único y la autenticación de dos factores.
- Ejemplo de un entregable: Implementar el nuevo inicio de sesión único en toda la empresa.

Los entregables del proyecto describen claramente las actividades necesarias para que el proyecto avance según lo previsto y se complete. Además, ayudan a los equipos internos del proyecto a alinearse, coordinar esfuerzos y priorizar tareas.

Los entregables son los resultados tangibles que un proyecto proporcionará a las partes interesadas una vez finalizado. Estos entregables pueden estar dirigidos a diversos públicos, tanto internos como externos, dependiendo de si se presentan internamente a las partes interesadas de la propia empresa o externamente a los clientes.

Tipos de entregables

Para poder cumplir con los entregables, es importante saber para qué tipo de entregables trabajas. Afectará el modo en que des forma y efectivamente presentes el trabajo al finalizar el proyecto. Hay dos tipos de entregables, y el tipo de proyecto con el que trabajes determinará el tipo de entregable que realices.

1) Entregable externo: Es aquello en lo que probablemente piensas cuando hablas de “entregable de un proyecto”, y serán útiles para ganar clientes o conservarlos. Todo proyecto dependerá de un entregable o resultado final, pero es probable que otros entregables contribuyan a dicho resultado.

Algunos ejemplos de entregables externos son:

- Una actualización del sistema operativo que cumpla con requisitos específicos.
- Un informe de investigación que incluye recomendaciones prácticas.
- Auditoría de seguridad y recomendaciones.
- Sitio web totalmente optimizado.
- Documentos legales.

2) Entregables internos: Un entregable interno, tal como lo sugiere el nombre, es algo que aporta un beneficio a la empresa pero que puede no tener un impacto directo en los clientes. Si el usuario final del

proyecto es tu empresa, es probable que estés trabajando para un entregable interno. Algunos ejemplos de entregables internos son:

- Documento del plan del proyecto : una hoja de ruta que describe los plazos, los hitos y la asignación de recursos.
- Maquetas de diseño : representaciones visuales de nuevos diseños de productos.
- Diagrama de arquitectura técnica : un diagrama estructurado que muestra los componentes del sistema y sus interacciones.
- Casos de prueba e informes : escenarios de prueba documentados y resultados para verificar que todos los componentes funcionaran según lo previsto.
- Prototipo : una versión inicial con sus características principales.
- Informes de avances : un análisis reflexivo que repasa lo que funcionó, las dificultades encontradas y las lecciones aprendidas.

Gestionar con éxito los entregables del proyecto es fundamental para su finalización a tiempo y dentro del presupuesto. Desde una comunicación eficaz hasta la gestión de expectativas.

Confirmar que todos comprenden los entregables del proyecto es fundamental para su éxito. No definir claramente los detalles de un entregable puede generar confusión y frustración entre todos los involucrados. Además, puede suponer un coste adicional para su empresa, ya que tendrá que dedicar recursos extra para resolver problemas y superar deficiencias.

Los equipos de proyecto deben definir y perfeccionar adecuadamente los entregables mediante definiciones claras y una comunicación eficaz. Involucrar al equipo responsable del entregable y a todas las partes interesadas en estas discusiones ayuda a garantizar que todos comprendan el cronograma y el resultado previsto.
